ONYX corporation
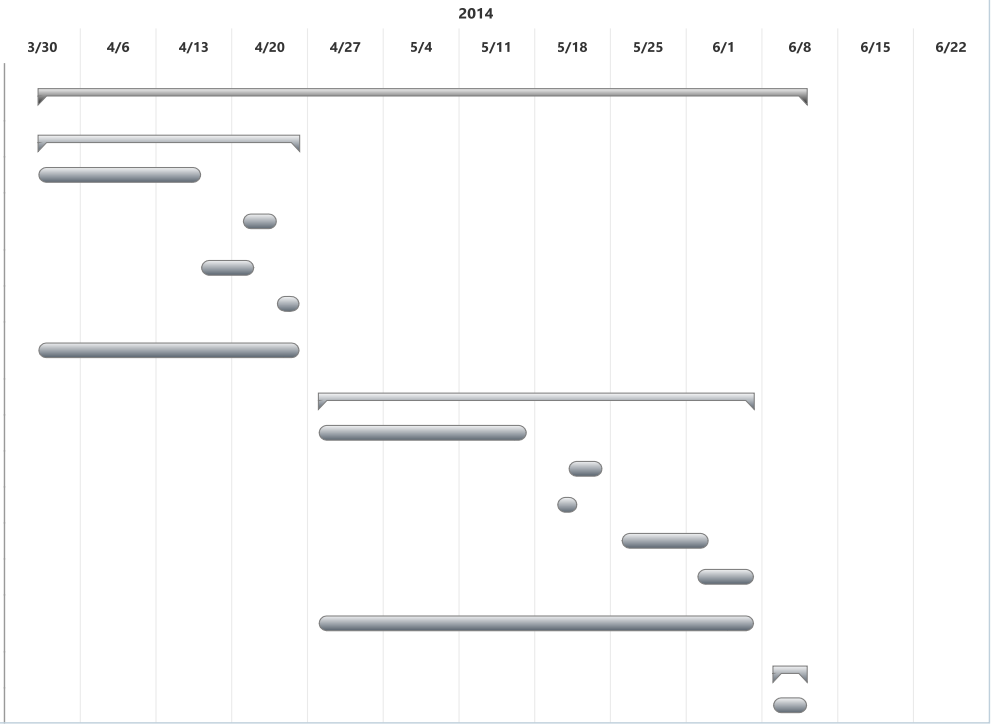
	Task	Start	End	Dur	%
	ACTON WATER MAIN PROJECT - Proposed 2014 schedule	4/2/14	6/11/14	50	
1	STOW STREET	4/2/14	4/25/14	18	
1.1	Complete 8" water main runs	4/2/14	4/16/14	11	
1.2	Complete final connections at adjacent streets	4/21/14	4/23/14	3	
1.3	Pressure test & chlorinate	4/17/14	4/21/14	3	
1.4	Prep trenches & pave	4/24/14	4/25/14	2	
1.5	Install trench paving (Every Friday)	4/2/14	4/25/14	18	
2	HAYWARD ROAD	4/28/14	6/6/14	29	
2.1	Complete 8" water main	4/28/14	5/16/14	15	
2.2	Pressure test & Chlorinate	5/21/14	5/23/14	3	
2.3	Connect at Main street (at night)	5/20/14	5/20/14	1	
2.4	Service Connections	5/26/14	6/2/14	5	
2.5	Clean-up & Spread topsoil	6/2/14	6/6/14	5	
2.6	Install trench paving (Every Friday)	4/28/14	6/6/14	29	
3	FINAL COMPLETION OF PUNCH LIST	6/9/14	6/11/14	3	
3.1	Pump grout into old mains	6/9/14	6/11/14	3
